2024年6月末現在の開発計画
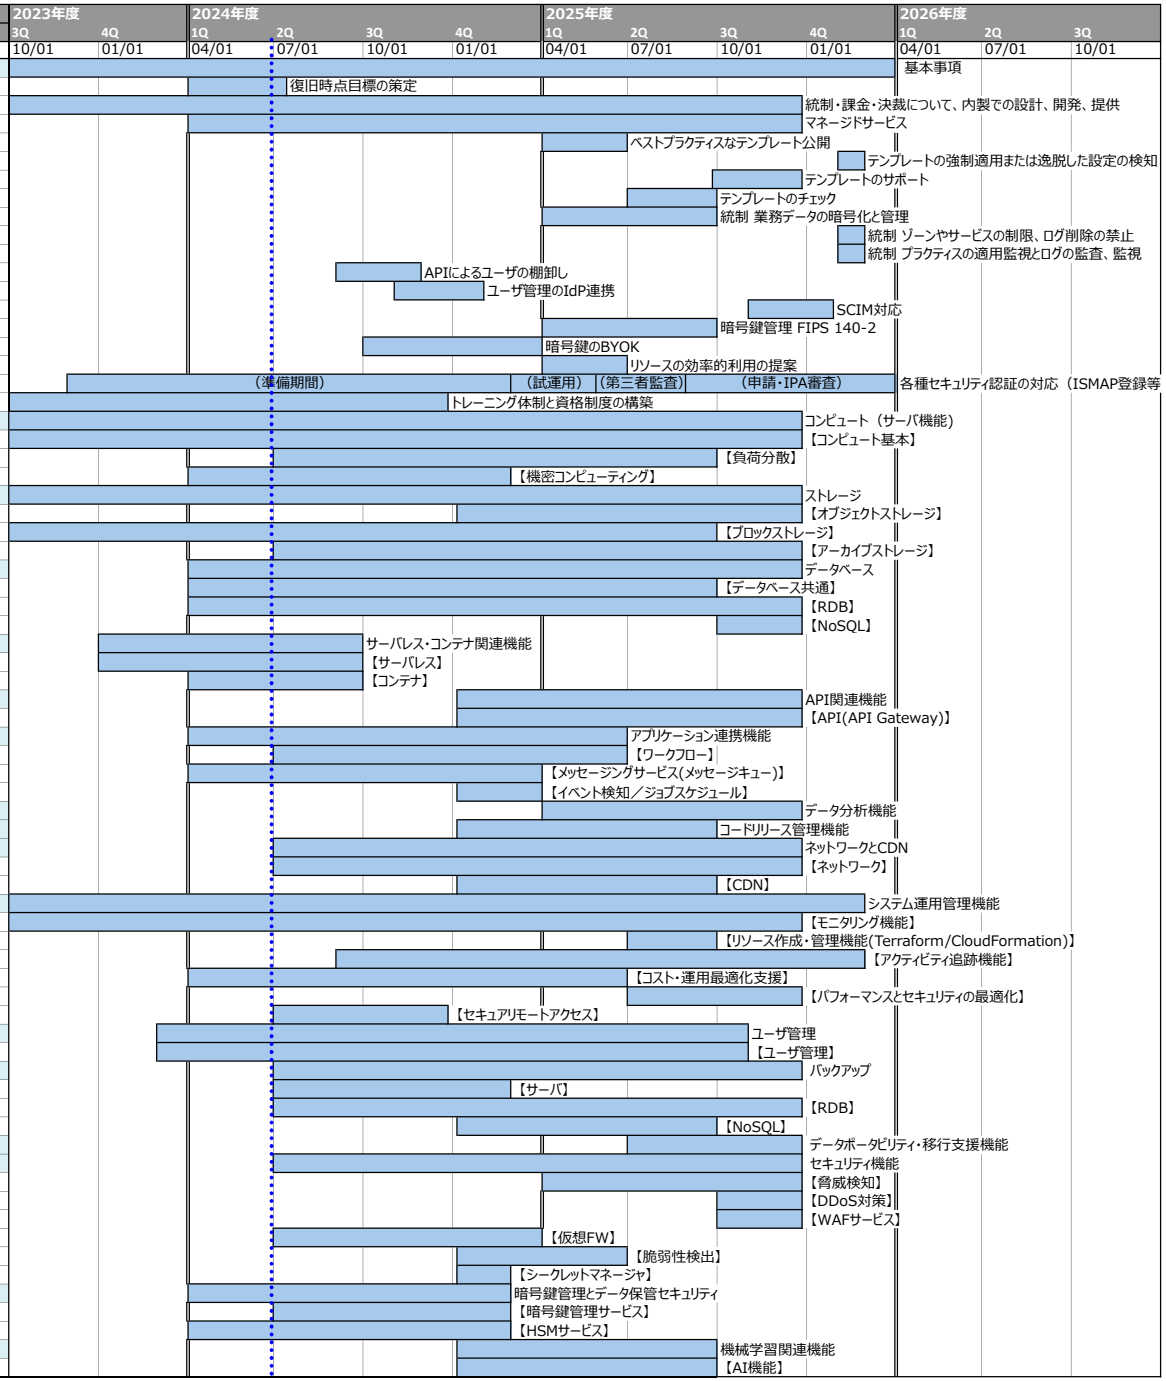
2024年6月末現在	計画		実績		達成		
	開始日	終了日	開始日	終了日	(完了タスク数)		
ガバクラ要件対応	**2023/10/02**	**2026/03/31**	**2023/10/02**		**3**	**/**	**121**
基本事項	**2023/10/02**	**2026/03/31**	**2023/10/02**		**0**	**/**	**20**
復旧時点目標の策定	2024/04/01	2024/07/12	2024/04/01		0	/	1
統制・課金・決裁について、内製での設計、開発、提供	2023/10/02	2025/12/26	2023/10/02		0	/	1
マネージドサービス	2024/04/01	2025/12/26	2024/04/01		0	/	1
ベストプラクティスなテンプレート公開	2025/04/01	2025/06/30			0	/	1
テンプレートの強制適用または逸脱した設定の検知	2026/02/02	2026/02/27			0	/	1
テンプレートのサポート	2025/09/30	2025/12/26			0	/	1
テンプレートのチェック	2025/07/01	2025/09/30			0	/	1
統制 業務データの暗号化と管理	2025/04/01	2025/09/30			0	/	1
統制 ゾーンやサービスの制限、ログ削除の禁止	2026/02/02	2026/02/27			0	/	1
統制 プラクティスの適用監視とログの監査、監視	2026/02/02	2026/02/27			0	/	1
APIによるユーザの棚卸し	2024/09/02	2024/11/29			0	/	1
ユーザ管理のIdP連携	2024/11/01	2025/01/31			0	/	1
SCIM対応	2025/11/03	2026/01/30			0	/	1
暗号鍵管理 FIPS 140-2	2025/04/01	2025/09/30			0	/	1
暗号鍵のBYOK	2024/10/01	2025/03/31			0	/	1
リソースの効率的利用の提案	2025/04/01	2025/06/30			0	/	1
各種セキュリティ認証の対応（ISMAP登録等）	2023/12/01	2026/03/31	2023/12/01		0	/	3
トレーニング体制と資格制度の構築	2023/10/02	2024/12/27	2023/10/02		0	/	1
コンピュート（サーバ機能）	**2023/10/02**	**2025/12/26**	**2023/10/02**		**2**	**/**	**9**
【コンピュート基本】	2023/10/02	2025/12/26	2023/10/02		2	/	5
【負荷分散】	2024/07/01	2025/09/30			0	/	2
【機密コンピューティング】	2024/04/03	2025/02/28	2024/04/03		0	/	2
ストレージ	**2023/10/02**	**2025/12/26**	**2023/10/02**		**0**	**/**	**11**
【オブジェクトストレージ】	2025/01/06	2025/12/26			0	/	4
【ブロックストレージ】	2023/10/02	2025/09/30	2023/10/02		0	/	4
【アーカイブストレージ】	2024/07/01	2025/12/26			0	/	3
データベース	**2024/04/01**	**2025/12/26**	**2024/02/01**		**0**	**/**	**8**
【データベース共通】	2024/04/01	2025/09/30	2024/05/01		0	/	2
【RDB】	2024/04/01	2025/12/26	2024/02/01		0	/	5
【NoSQL】	2025/10/01	2025/12/26			0	/	1
サーバレス・コンテナ関連機能	**2024/01/04**	**2024/09/30**	**2024/01/05**		**0**	**/**	**3**
【サーバレス】	2024/01/04	2024/09/30	2024/01/05		0	/	1
【コンテナ】	2024/04/01	2024/09/30	2024/04/01		0	/	2
API関連機能	**2025/01/06**	**2025/12/26**			**0**	**/**	**5**
【API(API Gateway)】	2025/01/06	2025/12/26			0	/	5
アプリケーション連携機能	**2024/04/01**	**2025/06/30**	**2024/04/01**		**0**	**/**	**4**
【ワークフロー】	2024/07/01	2025/06/30			0	/	1
【メッセージングサービス(メッセージキュー)】	2024/04/01	2025/03/31	2024/04/01		0	/	2
【イベント検知／ジョブスケジュール】	2025/01/06	2025/03/31			0	/	1
データ分析機能	**2025/04/01**	**2025/12/26**			**0**	**/**	**1**
コードリリース管理機能	**2025/01/06**	**2025/09/30**			**0**	**/**	**1**
ネットワークとCDN	**2024/07/01**	**2025/12/26**			**0**	**/**	**3**
【ネットワーク】	2024/07/01	2025/12/26			0	/	2
【CDN】	2025/01/06	2025/09/30			0	/	1
システム運用管理機能	**2023/10/02**	**2026/02/27**	**2023/10/02**		**0**	**/**	**27**
【モニタリング機能】	2023/10/02	2025/12/26	2023/10/02		0	/	18
【リソース作成・管理機能(Terraform/CloudFormatio	2025/07/01	2025/09/30			0	/	1
【アクティビティ追跡機能】	2024/09/02	2026/02/27			0	/	3
【コスト・運用最適化支援】	2024/04/01	2025/06/30	2024/02/27		0	/	3
【パフォーマンスとセキュリティの最適化】	2025/07/01	2025/12/26			0	/	1
【セキュアリモートアクセス】	2024/07/01	2024/12/27			0	/	1
ユーザ管理	**2024/03/01**	**2025/10/31**	**2024/03/01**		**1**	**/**	**8**
【ユーザ管理】	2024/03/01	2025/10/31	2024/03/01		1	/	8
バックアップ	**2024/07/01**	**2025/12/26**			**0**	**/**	**5**
【サーバ】	2024/07/01	2025/02/28			0	/	1
【RDB】	2024/07/01	2025/12/26			0	/	3
【NoSQL】	2025/01/06	2025/09/30			0	/	1
データポータビリティ・移行支援機能	**2025/07/01**	**2025/12/26**			**0**	**/**	**1**
セキュリティ機能	**2024/07/01**	**2025/12/26**			**0**	**/**	**8**
【脅威検知】	2025/04/01	2025/12/26			0	/	3
【DDoS対策】	2025/10/01	2025/12/26			0	/	1
【WAFサービス】	2025/10/01	2025/12/26			0	/	1
【仮想FW】	2024/07/01	2025/03/31			0	/	1
【脆弱性検出】	2025/01/06	2025/06/30			0	/	1
【シークレットマネージャ】	2025/01/06	2025/02/28			0	/	1
暗号鍵管理とデータ保管セキュリティ	**2024/04/03**	**2025/02/28**	**2024/04/03**		**0**	**/**	**6**
【暗号鍵管理サービス】	2024/07/01	2025/02/28	2024/06/03		0	/	5
【HSMサービス】	2024/04/03	2025/02/28	2024/04/03		0	/	1
機械学習関連機能	**2025/01/06**	**2025/09/30**			**0**	**/**	**1**
【AI機能】	2025/01/06	2025/09/30			0	/	1
